Перечень работ по устройству средств ДТУ ПС Новая
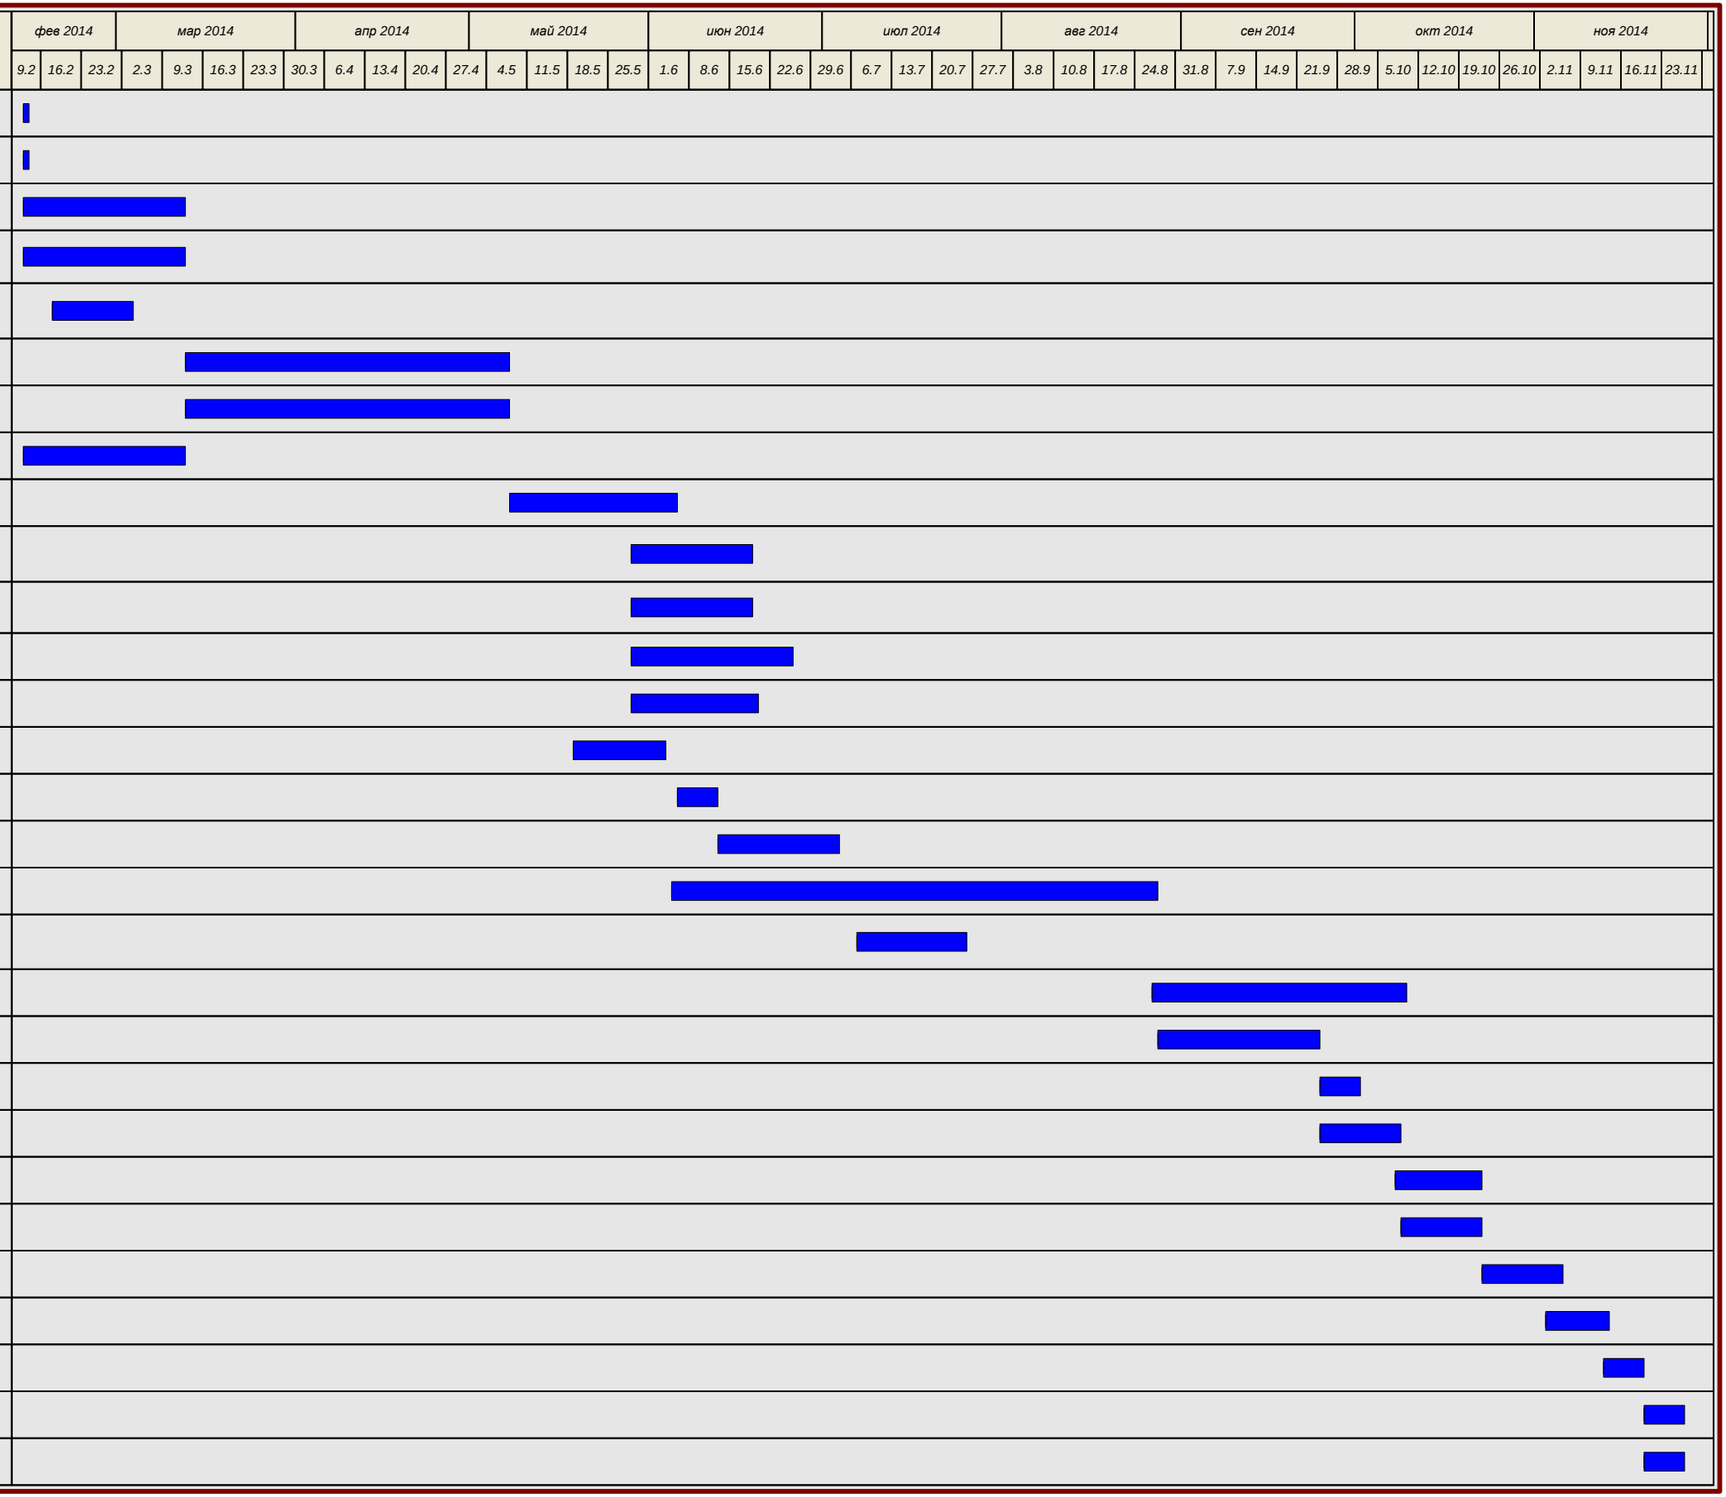
№ п\п	Название задачи	Начало	Окончание	Длительность
1	Разработка ТЗ, ТТ, ТУ заинтересованных лиц.	13.02.2014	13.02.2014	,2н
2	Согласование ТЗ с системным оператором	13.02.2014	13.02.2014	,2н
3	Запрос ТУ на присоединение к средствам ДТУ Системного оператора	13.02.2014	12.03.2014	4н
4	Запрос ТУ у собственников помещений и оборудования, участвующего в каналообразовании (с получением ответа)	13.02.2014	12.03.2014	4н
5	Знакомство с персоналом РДУ, ПМЭС, заказчиком, выяснение требований эксплуатирующего персонала	18.02.2014	03.03.2014	2н
6	Разработка проекта (опционально)	13.03.2014	07.05.2014	8н
7	Разработка рабочей документации	13.03.2014	07.05.2014	8н
8	Согласование нормальной схемы ПС с СО	13.02.2014	12.03.2014	4н
9	Согласование РД с РДУ, ОДУ (при необходимости)	08.05.2014	05.06.2014	4,2н
10	Согласование схем организации основного и резервного каналов связи ТМ и ДК с СО и заинтересованными организациями	29.05.2014	18.06.2014	3н
11	Согласование схем разграничения эксплуатационной ответственности по каналам ДК и ТМ	29.05.2014	18.06.2014	3н
12	Согласование перечня ТС и ТИ с СО	29.05.2014	25.06.2014	4н
13	Разработка и согласование регламента взаимодействия	29.05.2014	19.06.2014	3,2н
14	Запрос членов комиссии в РДУ и согласование Приказа на комплексные испытания	19.05.2014	03.06.2014	2,4н
15	Разработка ПМИ	06.06.2014	12.06.2014	1н
16	Согласование ПМИ с СО	13.06.2014	03.07.2014	3н
17	Заказ оборудования	05.06.2014	27.08.2014	12н
18	Согласование настройки каналообразующего оборудования, протоколов и интерфейсов сопряжения с оборудованием РДУ	07.07.2014	25.07.2014	3н
19	Организация каналов связи до РДУ и др.	27.08.2014	09.10.2014	6,4н
20	Монтаж оборудования	28.08.2014	24.09.2014	4н
21	Разработка исполнительной документации	25.09.2014	01.10.2014	1н
22	Пуско-наладка оборудования	25.09.2014	08.10.2014	2н
23	Разработка и согласование инструкций по эксплуатации с эксплуатирующей организацией	08.10.2014	22.10.2014	2,2н
24	Измерение каналов ДК и ТМ, паспортизация и согласование паспортов с РДУ	09.10.2014	22.10.2014	2н
25	Разработка и согласование Акта готовности к проведению комплексных испытаний	23.10.2014	05.11.2014	2н
26	Согласование сроков проведения ПСИ	03.11.2014	13.11.2014	1,8н
27	Проведение ПСИ	13.11.2014	19.11.2014	1н
28	Обучение эксплуатирующего персонала	20.11.2014	26.11.2014	1н
29	Разработка и подписание Акта ввода в опытную эксплуатацию	20.11.2014	26.11.2014	1н
